

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTE DOS ANEXOS DESTA EDITAL.

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços Nº 020/2022, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 381.525,83 (trezentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), sendo:

para o LOTE 01 R\$ 32.588,04 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos),

para o LOTE 02 R\$ 4.905,69 (quatro mil novecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos),

para o LOTE 03 R\$ 53.987,29 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos),

para o LOTE 04 R\$ 135.692,49 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos),

para o LOTE 05 R\$ 21.459,52 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos),

para o LOTE 06 R\$ 24.638,57 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos),

para o LOTE 07 R\$ 45.718,46 (quarenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)

para o LOTE 08 R\$ 41.076,25 (quarenta e um mil setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e

para o LOTE 09 R\$ 21.459,52 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), fixos e irrealizáveis.

Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto, bem como o preço dos lotes.

LOTE 01 – PROJETO DE QUADRA COM BANHEIRO E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 02 – PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO FLOR DA VILA - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92%;

LOTE 03 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA AVENIDA INTERLAGO - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 04 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AVENIDA INDUSTRIAL - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 05 – PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;



LOTE 06 – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS SONHOS – RUA JOAQUIM MAURÍCIO GROTHE – BAIRRO VILA ELIAS - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 07 – PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO – BOTUPARQUE – JARDIM BOTUJURU - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 08 – PROJETO PARA REFORMA E DESTINAÇÃO DA BIBLIOTECA – PRAÇA TENENTE CEL. MESQUITA - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %;

LOTE 09 – PROJETO PARA REFORAMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI ALDO MOREIRA DE LIMA - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92 %.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta. ✓
- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal. ✓

Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias para o **LOTE 01 – PROJETO DE QUADRA COM BANHEIRO E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC**; 30 (trinta) dias para o **LOTE 02 – PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO FLOR DA VILA**; 90 (noventa) dias para o **LOTE 03 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA AVENIDA INTERLAGO**; 120 (cento e vinte) dias para o **LOTE 04 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AVENIDA INDUSTRIAL**; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO ÁGUA PARA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAÚ; PONTE NA ESTRADA DA BASÍLIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO; 60 (sessenta) dias para o **LOTE 05 – PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA**; 60 (sessenta) dias para o **LOTE 06 – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS SONHOS – RUA JOAQUIM MAURÍCIO GROTHE – BAIRRO VILA ELIAS**; 90 (noventa) dias para o **LOTE 07 – PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO – BOTUPARQUE – JARDIM BOTUJURU**; 90 (noventa) dias para o **LOTE 08 – PROJETO PARA REFORMA E DESTINAÇÃO DA BIBLIOTECA – PRAÇA TENENTE CEL. MESQUITA** e 90 (noventa) dias para o **LOTE 09 – PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI ALDO MOREIRA DE LIMA**, contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓

Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. ✓

Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no item 11.4 do edital.


Eu, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, RG nº 60.264.607-8 (SSP/SP), CPF/MF n.º 073.149.257-98, sócio administrador, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/MF n.º 17.155.297/0001-67, Inscrição Estadual nº 574.117.909.110, Inscrição Municipal nº 5282491 e situada a Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102, Sala 210, Centro, Registro/SP, declaro que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao

pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Declaro também que:

- Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa; ✓
- Que no preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço; ✓

Registro, 17 de março de 2023.




OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI - EPP

Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
EIRELI - EPP
Av Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11900-000
REGISTRO - SP



TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022


Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para atender a diversos departamentos em diferentes locais no município de Jacupiranga

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Elaboração de Projetos

Local: Diversos locais do município de Jacupiranga, conforme Termo de Referência

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI - (R\$)	Total (R\$)
LOTE 1.			PROJETO DE QUADRA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC					
1.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 6.828,27
1.2	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 5.007,82
1.3	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	TX	1,00	R\$ 1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 1.518,55
1.4	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	R\$ 94,06	R\$ 118,44	R\$ 3.553,21
1.5	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 2.149,89
1.6	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 2.387,29
1.7	SIURB	200.533	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.849,27	R\$ 8.624,61	R\$ 8.624,61
1.8	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
1.9	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								32.588,04
LOTE 2.			PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO FLOR DA VILA					
2.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 2.387,29
2.2	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
2.3	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								4.905,69
LOTE 3.			PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA AVENIDA INTERLAGOS, S/Nº - VILA ELIAS					
3.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	4,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 13.656,54
3.2	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 3.414,14
3.3	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	3,00	R\$ 1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 7.511,73
3.4	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	TX	1,00	R\$ 1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 1.518,55
3.5	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	R\$ 94,06	R\$ 118,44	R\$ 3.553,21
3.6	CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000M² (MÍNIMO DE 3.500M²)	M2	3.500,00	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.878,34
3.7	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 2.149,89
3.8	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 7.161,88
3.9	SIURB	200.533	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.849,27	R\$ 8.624,61	R\$ 8.624,61
3.10	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
3.11	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 53.987,29
LOTE 4.			PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AV. INDUSTRIAL; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO ÁGUA PARADA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAÚ; PONTE NA ESTRADA DA BASÍLIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO					
4.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 20.484,82
4.2	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	18,00	R\$ 1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 45.070,37
4.3	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	TX	6,00	R\$ 1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 9.111,28
4.4	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	240,00	R\$ 94,06	R\$ 118,44	R\$ 28.425,72

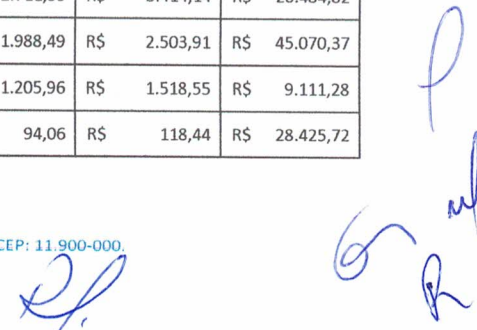

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022


Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para atender a diversos departamento em diferentes locais no município de Jacupiranga

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Elaboração de Projetos

Local: Diversos locais do município de Jacupiranga, conforme Termo de Referência

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI - (R\$)	Total (R\$)
4.5	CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000M² (MINIMO DE 3.500M²)	M2	3.500,00	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.878,34
4.6	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 6.449,66
4.7	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 7.161,88
4.8	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	6,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 7.555,21
4.9	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 7.555,21
SUBTOTAL								R\$ 135.692,49
LOTE 5.			PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA					
5.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 6.828,27
5.2	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 2.503,91
5.3	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	TX	1,00	R\$ 1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 1.518,55
5.4	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MINIMO DE 30 M)	M	30,00	R\$ 94,06	R\$ 118,44	R\$ 3.553,21
5.5	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 2.387,29
5.6	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 2.149,89
5.7	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
5.8	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 21.459,52
LOTE 6.			PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS SONHOS - RUA JOAQUIM MAURICIO GROTHE - BAIRRO VILA ELIAS					
6.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 6.828,27
6.2	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 3.414,14
6.3	CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000M² (MINIMO DE 3.500M²)	M2	3.500,00	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.878,34
6.4	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	3,00	R\$ 853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 3.224,83
6.5	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	4,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 4.774,59
6.6	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
6.7	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 24.638,57
LOTE 7.			PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO - BOTUPARQUE - JARDIM BOTUJURU					
7.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	3,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 10.242,41
7.2	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO EM FORMATO A1	UN	1,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 3.414,14
7.3	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM FORMATO A1	UN	1,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 3.414,14
7.4	CDHU	01.27.021	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UN	1,00	10.464,31	R\$ 13.176,67	R\$ 13.176,67
7.5	CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000M² (MINIMO DE 3.500M²)	M2	3.500,00	0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.878,34
7.6	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	4,00	853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 4.299,77
7.7	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	4,00	947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 4.774,59
7.8	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
7.9	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 45.718,46
LOTE 8.			PROJETO PARA REFORMA E DESTINAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRAÇA TENENTE CEL. MESQUITA					

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para atender a diversos departamentos em diferentes locais no município de Jacupiranga

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: Elaboração de Projetos

Local: Diversos locais do município de Jacupiranga, conforme Termo de Referência

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI - (R\$)	Total (R\$)
8.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 6.828,27
8.2	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM FORMATO A1	UN	1,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 3.414,14
8.3	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 2.503,91
8.4	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEGEM	TX	1,00	1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 1.518,55
8.5	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	94,06	R\$ 118,44	R\$ 3.553,21
8.6	CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000M² (MÍNIMO DE 3.500M²)	M2	3.500,00	0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.878,34
8.7	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 1.074,94
8.8	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 7.161,88
8.9	SIURB	200.533	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 6.849,27	R\$ 8.624,61	R\$ 8.624,61
8.10	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
8.11	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 41.076,25
LOTE 9.			PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI ALDO MOREIRA DE LIMA					
9.1	CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	2.711,35	R\$ 3.414,14	R\$ 6.828,27
9.2	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	1.988,49	R\$ 2.503,91	R\$ 2.503,91
9.3	CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEGEM	TX	1,00	1.205,96	R\$ 1.518,55	R\$ 1.518,55
9.4	CDHU	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	94,06	R\$ 118,44	R\$ 3.553,21
9.5	CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	853,67	R\$ 1.074,94	R\$ 2.149,89
9.6	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 947,94	R\$ 1.193,65	R\$ 2.387,29
9.7	AEA	08	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
9.8	AEA	analogia ao item 08	MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	1.000,00	R\$ 1.259,20	R\$ 1.259,20
SUBTOTAL								R\$ 21.459,52
VALOR TOTAL								381.525,83


REFERÊNCIA:

CDHU - Boletim 188 - Com Desoneração

AEA - Tabela de Honorários da Associação dos Engenheiros do Vale do Ribeira


SIURB - 06/2022

Registro, 17 de março de 2023.



OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI - EPP
Rafael Oliveira da Silva
RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
EIRELI - EPP
Av Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11900-000
REGISTRO - SP



TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para atender a diversos departamentos em diferentes locais no município de Jacupiranga

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05 dias da data de assinaturas da O.S.

FINAL: 120 dias a partir da data de assinatura da O.S.

DATA BASE:

novembro-22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Elaboração de Projetos

Local: Diversos locais do município de Jacupiranga, conforme Termo de Referência

Item	Serviços	Unidade	1º Mês 30 dias	2º Mês 60 dias	3º Mês 90 dias	4º Mês 120 dias	Valor do Item (R\$)
1.	PROJETO DE QUADRA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC	%	50%	50%			
		R\$	R\$ 16.294,02	R\$ 16.294,02			R\$ 32.588,04
2.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO FLOR DA VILA	%	100%				
		R\$	R\$ 4.905,69				R\$ 4.905,69
3.	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA AVENIDA INTERLAGOS, S/Nº - VILA ELIAS	%	33%	33%	33%		
		R\$	R\$ 17.995,76	R\$ 17.995,76	R\$ 17.995,76		R\$ 53.987,29
4.	PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AV. INDUSTRIAL; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO ÁGUA PARADA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAUÍ; PONTE NA ESTRADA DA BASÍLIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO	%	25%	25%	25%	25%	
		R\$	R\$ 33.923,12	R\$ 33.923,12	R\$ 33.923,12	R\$ 33.923,12	R\$ 135.692,49
5.	PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA	%	50%	50%			
		R\$	R\$ 10.729,76	R\$ 10.729,76			R\$ 21.459,52
6.	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS SONHOS - RUA JOAQUIM MAURICIO GROTHE - BAIRRO VILA ELIAS	%	50%	50%			
		R\$	R\$ 12.319,29	R\$ 12.319,29			R\$ 24.638,57
7.	PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO - BOTUPARQUE - JARDIM BOTUJURU	%	33%	33%	33%		
		R\$	R\$ 15.239,49	R\$ 15.239,49	R\$ 15.239,49		R\$ 45.718,46
8.	PROJETO PARA REFORMA E DESTINAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRAÇA TENENTE CEL. MESQUITA	%	33%	33%	33%		
		R\$	R\$ 13.692,08	R\$ 13.692,08	R\$ 13.692,08		R\$ 41.076,25
9.	PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI ALDO MOREIRA DE LIMA	%	33%	33%	33%		
		R\$	R\$ 7.153,17	R\$ 7.153,17	R\$ 7.153,17		R\$ 21.459,52
Total Mensal (R\$)			R\$ 132.252,38	R\$ 127.346,69	R\$ 88.003,63	R\$ 33.923,12	381.525,83
Percentual Mensal(%)			34,66%	33,38%	23,07%	8,89%	100,00%

Registro, 17 de março de 2023.



OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI - EPP
Rafael Oliveira da Silva

RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 102 - Centro - Sala 210 - Via Spézio - Registro/SP - CEP: 11.900-000.

Telefone: (13) 3821-1332 - (13) 9 9704-1976

oliveiraduarte@oliveiraduarte.com - administrativo@oliveiraduarte.com

17.155.297/0001-67

OLIVEIRA ENGENHARIA
EIRELI - EPP

Av Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11900-000

REGISTRO - SP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTE DOS ANEXOS DESTE EDITAL.


DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS OBRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
	Despesas indiretas	
AC:	Taxa de administração central;	4,97%
S:	Taxa de seguros;	0,73%
R:	Taxa de riscos;	1,27%
G:	Taxa de garantias;	0,07%
DF:	Taxa de despesas financeiras;	1,23%
Total Despesas Indiretas		8,27%
	Bonificação	
L:	Taxa de lucro / remuneração;	6,16%
Total Bonificação		6,16%
	Detalhe Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	3,00%
	CPRB	2,00%
I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	8,65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	25,92%

Registro, 17 de março de 2023.



OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Rafael Oliveira da Silva
RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA
EIRELI - EPP
Av Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11900-000
REGISTRO - SP



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 127/2022

OBJETO: Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projetos, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital.

Apresentamos pelo presente **TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL**, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços N° 020/2022, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de **R\$ 180.863,99** (Cento e oitenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo para o

LOTE 01 R\$ 30.552,55 (Trinta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), para o

LOTE 04 R\$ 130.320,24 (Cento e trinta mil, trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), para o

LOTE 05 R\$ 19.991,20 (Dezenove mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) fixos e irreeajustáveis.

Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto, bem como o preço dos lotes.

LOTE 01 – PROJETO DE QUADRA COM BANHEIRO E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,73 %

(Necessária apresentação de Planilha Orçamentária e Cronograma-Físico Financeiro pela empresa).

LOTE 04 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AVENIDA INDUSTRIAL - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,73 %

(Necessária apresentação de Planilha Orçamentária e Cronograma-Físico Financeiro pela empresa).

LOTE 05 – PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,73 %

(Necessária apresentação de Planilha Orçamentária e Cronograma-Físico Financeiro pela empresa).


O Prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta.

Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal.

Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução dos serviços na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a:

- 60 (sessenta) dias para o **LOTE 01 – PROJETO DE QUADRA COM BANHEIRO E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC;**

- 120 (cento e vinte) dias para o **LOTE 04 – PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AVENIDA INDUSTRIAL; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO**



ÁGUA PARA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAÚ; PONTE NA ESTRADA DA BASÍLIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO;

- 60 (sessenta) dias para o **LOTE 05** – PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA, contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital.

Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pelo Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras.

Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no item 11.4 do edital.

Eu, **Silverio Domingues**, Engenheiro Civil, RG nº 22.117.282-8, CPF/MF n.º129.409.758-09, Sócio proprietário, **DECLARO** pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa Silverio Domingues Serviços de Engenharia EPP, CNPJ/MF n.º23.210.621/0001-03, Inscrição Estadual nº 740.021.023.112, Inscrição Municipal nº 22039 e endereço a Rua Mario Covas, 11 – Jardim Santa Rita, Cajati/SP, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução dos serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Cajati, 17 de março de 2023



SDM Engenharia e Consultoria

Eng.º Silverio Domingues - CREA-SP: 5061285557
R.G. 22.117.282-8



SILVERIO DOMINGUES SERV. DE ENGENHARIA EPP

CNP.J.: 23.210.621/0001-03

PROPOSTA LOTES 01-04 E 05

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM DIFERENTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unif. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	LOTE 01	PROJETO DE QUADRA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RESCINTO DA CEXPEJAC					
CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.394,72	R\$ 6.789,44
CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.388,88	R\$ 4.777,76
CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	TX	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.257,30	R\$ 1.257,30
CDHU	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	R\$ 90,00	R\$ 113,16	R\$ 3.394,80
CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.005,84	R\$ 2.011,68
CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 900,00	R\$ 1.131,57	R\$ 2.263,14
SIURB	200.533	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M²	GL	1,00	R\$ 6.500,00	R\$ 8.172,47	R\$ 8.172,47
AEA	B	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 850,00	R\$ 1.068,71	R\$ 1.068,71
AEA	ANALOGIA AO ITEM 8	MEMORIAL DESCRITIVO	JG	1,00	R\$ 650,00	R\$ 817,25	R\$ 817,25
						SUBTOTAL	R\$ 30.562,55
	LOTE 04	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 118 E AVENIDA INDUSTRIAL; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO ÁGUA PARA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAÚ; PONTE NA ESTRADA DA BASÍLIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO					
CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.394,72	R\$ 20.368,32
CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	18,00	R\$ 1.950,00	R\$ 2.451,74	R\$ 44.131,32
CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	TX	6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.508,76	R\$ 9.052,56
CDHU	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	240,00	R\$ 94,00	R\$ 118,19	R\$ 28.365,60
CDHU	01.20.781	LEVANTAMENTO PLANIALIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000 M² (MÍNIMO DE 3.500 M²)	M2	3.500,00	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 3.885,00
CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 650,00	R\$ 1.068,71	R\$ 6.412,26
CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	6,00	R\$ 900,00	R\$ 1.131,57	R\$ 6.789,42
AEA	B	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	6,00	R\$ 850,00	R\$ 1.068,71	R\$ 6.412,26
AEA	ANALOGIA AO ITEM 8	MEMORIAL DESCRITIVO	JG	6,00	R\$ 650,00	R\$ 817,25	R\$ 4.903,50
						SUBTOTAL	R\$ 130.320,24
	LOTE 05	PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO FÉ DA SERRA					
CDHU	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.394,72	R\$ 6.789,44
CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.388,88	R\$ 2.388,88
CDHU	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	TX	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.257,30	R\$ 1.257,30
CDHU	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	30,00	R\$ 90,00	R\$ 113,16	R\$ 3.394,80
CDHU	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.005,84	R\$ 2.011,68
CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R\$ 900,00	R\$ 1.131,57	R\$ 2.263,14
AEA	B	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS	JG	1,00	R\$ 850,00	R\$ 1.068,71	R\$ 1.068,71
AEA	ANALOGIA AO ITEM 8	MEMORIAL DESCRITIVO	JG	1,00	R\$ 650,00	R\$ 817,25	R\$ 817,25
						SUBTOTAL	R\$ 19.991,20
						TOTAL GERAL	R\$ 180.863,99

Silverio Domingues
 Engenheiro CMI - CREA 506128557
 RG. 22.117.262-8 - CPF 129.409.758-03

Cajati, 17 de março de 2.023

GRM



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SILVERIO DOMINGUES SERV. DE ENGENHARIA EPP
CNP.J.: 23.210.621/0001-03

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRazo PROPOSTO						TOTAL
			1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	5ª Mês	6ª Mês	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM DIFERENTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA			INÍCIO: 05 dias da data da assinatura do O.S. FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do O.S.						DATA BASE: março-23
1	LOTE 01		PROJETO DE QUADRA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RECINTO DA CEXPEJAC						
		%	50%						
		R\$	15.276,28	15.276,28					30.552,55
2	LOTE 04		PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA JOSEFA COM ENTRONCAMENTO NA BR 116 E AVENIDA INDUSTRIAL; 2 (DUAS) PONTES NO BAIRRO ÁGUA PARA; PONTE NA ESTRADA DO GUARAU; PONTE NA ESTRADA DA BASILIA E PONTE NO BAIRRO PINDAÚBA DO MEIO						
		%	25%	25%	25%	25%	25%		
		R\$	32.580,06	32.580,06	32.580,06	32.580,06	32.580,06		130.320,24
3	LOTE 05		PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA NO BAIRRO PÉ DA SERRA						
		%	50%	50%					
		R\$	9.995,60	9.995,60					19.991,20
TOTAL			R\$ 57.851,94	R\$ 57.851,94	R\$ 32.580,06	R\$ 32.580,06	R\$ 32.580,06	R\$ 180.863,99	

Castali, 17 de março de 2023

Silverio Domingues
Engenheiro Civil - Crea 5061285557

DECLARAÇÃO DE CONTRATO DE SUBEMPREITADA

Nome completo: Silverio Domingues

RG nº: 22.117.282-8 CPF nº: 129.409.758-09

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **Silverio Domingues Serviços de Engenharia-EPP**, Cadastrado no CNPJ nº 23.210.621/0001-03, com sede a Rua Mario Covas, 11 – Jd. Santa Rita – Cajati/SP.

Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa.

Cajati, 16 de março de 2023



SDM Engenharia e Consultoria

Eng.º Silverio Domingues - CREA-SP: 5061285557
R.G. 22.117.282-8



DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA


TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 127/2022

OBJETO: **Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projetos, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital.**

Despesas indiretas		
AC:	Taxa de administração central;	3,00%
S:	Taxa de seguros;	0,40%
R:	Taxa de riscos;	0,97%
G:	Taxa de garantias;	0,40%
DF:	Taxa de despesas financeiras;	0,59%
Total Despesas Indiretas		5,36%
Bonificação		
L:	Taxa de lucro / remuneração;	6,00%
Total Bonificação		6,00%
Detalhe Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	3,00%
	CPRB	4,50%
I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	11,15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	-1 25,73%

Cajati, 17 de março de 2023


SDM Engenharia e Consultoria
Eng.º Silverio Domingues - CREA-SP: 5061285557
R.G. 22.117.282-8

